

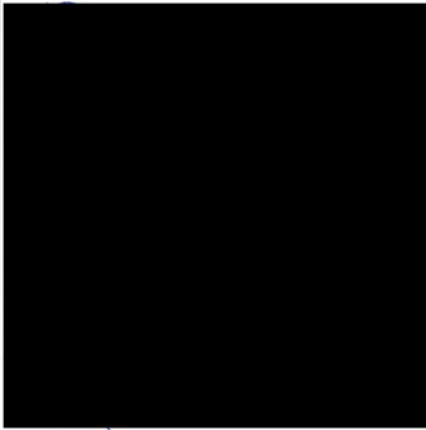
## Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej dokončenej časti)

<b>Stavebník (názov, sídlo, odtlačok pečiatky):</b> Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava		<b>Číslo zápisu:</b> 1/2022
<b>Dátum začatia PK:</b> 21.6.2022	<b>Názov verejnej práce (Diela):</b> „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V.“	
<b>Názov dokončenej časti verejnej práce:</b>		
<b>Účel a technický opis verejnej práce:</b> Predmetom riešenia predkladaného objektu je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch pre cyklistov a peších. Objekt pozostáva z jednotlivých dielčích vetiev:  Vetva A- (km 0,00000 - km 0,20855) vetva rieši práce v úseku od križovatky ulíc Kutlíková x Romanova po vjazd k objektu pre poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti – Dom Rafael. Vetva B – (km 0,00000 - km 0,39357) vetva rieši práce v úseku od vjazdu k objektu – Dom Rafael po križovatku miestnej komunikácie Kutlíkova x miestna komunikácia k objektu Hájpark. Vetva C – (km 0,00000 - km 0,30780) vetva rieši práce v úseku od križovatky miestnej komunikácie Kutlíkova x miestna komunikácia k objektu Hájpark po križovatku miestnej komunikácie Kutlíkova x, Starohájska. Na náprotivnej strane pri KÚ vetvy C sa tiež vykonávajú udržiavacie práce na chodníku.		
<b>Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:</b> Podielové spolufinancovanie: 100 % Hlavné mesto SR Bratislava;		
<b>Kapacity získané výstavbou:</b> Rekonštruovaný cyklistický chodník v dl. 945,67 m;		
<b>Zodpovedný stavbyvedúci:</b> Ing. Jozef Šugár	<b>Zhotoviteľ:</b> EUROVIA SK a.s	
<b>Projektant (spracovateľ PD):</b> Ing. Gabriel Bálint, Ing. Norbert Nemeč	<b>Projektanti ucelených častí:</b> METRO Bratislava a.s.	
<b>Stavebný dozor:</b> METRO Bratislava a.s., Ing. Karol Polakevič		
<b>Stavebné povolenie č.:</b> 8900/2021/ŠSÚ/33400	<b>zo dňa:</b> 3.11.2021	<b>vydal:</b> MČ Bratislava - Petržalka
<b>Zmena stavebného povolenia č.:</b>	<b>zo dňa:</b>	<b>vydal:</b>
<b>Protokol o štátnej expertíze č.:</b>	<b>zo dňa:</b>	<b>vydal:</b>
<b>Zmluva (objednávka) o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa:</b> 25.3.2022 <b>vrátane:</b> 1 dodatku		
<b>Dátum začatia prác podľa zmluvy:</b>	<b>Dátum skutočného začatia prác:</b> 25.4.2022	<b>Dátum dokončenia prác podľa zmluvy:</b> 6.6.2022
<b>Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce:</b> Práce navyiac a nepriaznivé počasie;		
<b>Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:</b> Úprava profilu na konci úseku stavby pri priechode so Starohájskou ul.;		
<b>Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:</b> ZoD a platné normy a predpisy;		
<b>Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):</b> -		
<b>Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (alebo jej dokončenej časti) stavebníkom (preberajúcim):</b> Práce boli vykonané v zmysle vypracovanej PD a zmluvy.		
<b>Súpis väd a nedorobkov zrejmych pri odovzdávaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:</b> - <i>zatravnenie pásu zelene</i>		
<b>Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov verejnej práce alebo jej dokončenej časti:</b> <i>do konca roka 2022</i>		
<b>Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %):</b>		
<b>Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:</b> Prístup na stavenisko je nezabezpečený.		
<b>Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie verejnej práce:</b>		

## Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej dokončenej časti)

Stavenisko bude vypratane po odstraneni nedorobkov.			
<b>Dalsie dohodnuté podmienky:</b> Zhotoviteľ bezodkladne zrealizuje všetky požadované práce a odstráni všetky závady zistené v priebehu obhliadky staveniska, ktoré budú vyplývať zo stanoviska stavebného úradu a ostatných oprávnených inštitúcií.			
<b>Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti diela:</b> Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – stavebná časť: 6x v tlačí, Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – geodetická časť: 4x v tlačí, Doklad o odovzdaní geodetického zamerania do digitálnej mapy; Elaborát kvality – 4x Stavebný denník – 2x Zápis o likvidácii odpadu a recyklácii			
<b>Údaje o archivovaní dokumentácie:</b> 1x Hlavné mesto SR BA, 1x EUROVIA SK a.s., 2x Správca OSK, 1x Stavebný dozor METRO BA a.s.			
<b>Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:</b> viď Dokumentáciu skutočného realizovania/vyhotovenia Diela;			
<b>Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov v € (s DPH):</b> Zmluvná cena bez DPH: 188 514,58 € DPH 20%: 37 702,91 € Zmluvná cena celkom vrátane DPH: 226 217,49 €			
<b>Zľava z ceny a jej dôvody v €:</b> -			
<b>Cena po odpočítaní zľavy v €:</b> -			
<b>Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:</b> Zvýšenie ceny diela /– práce navyč z dôvodu nadmerných búracích prác a s nimi nadviazané položky ako: odstránenie podkladového betónu a podkladovej vrstvy, poplatok za skládkovanie betónov a odvozu, podklad zo ŠD, vrstva CBGM C 5/6 a asfaltové zálievky. Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 ZoD dôjde k zmene ceny z rozsahu pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 23 093,50 EUR bez DPH (pričom objem menej prác je v hodnote 2 630,27 EUR bez DPH a objem viac prác je v hodnote 20 463,23 EUR bez DPH).			
<b>Odškodnenie za omeškania a iné sankcie v € podľa ZoD, resp. podľa Obchodného zákonníka:</b> -	<b>Odškodnenie za omeškania a iné sankcie v € podľa ZoD, resp. podľa Obchodného zákonníka:</b> -	<b>Odškodnenie za omeškania a iné sankcie v € podľa ZoD, resp. podľa Obchodného zákonníka:</b> -	
<b>Záručná lehota (konečný dátum):</b> Záručná doba podľa ZoD je 60 mesiacov, t.j. do			
<b>Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:</b>			
<b>Dátum skončenia preberacieho konania:</b> 15.8.2022			
<b>Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a zároveň ho odovzdávajú budúcemu užívateľovi, ktorý ho preberá.</b>			
	<b>Meno a priezvisko:</b>	<b>Funkcia:</b>	<b>Podpis a odtlačok pečiatky:</b>
<b>Zástupcovia zhotoviteľa:</b> EUROVIA SK a.s.	Jozef Šugár	Stavbyvedúci	
<b>Zástupcovia objednávateľa:</b> Hl. mesto Bratislava	Stanislav Skýva	Vedúci referátu cyklodopravy, sekcia dopravy	
<b>Zástupcovia stavebného dozora:</b> METRO Bratislava a.s.	Karol Polakevič	Stavebný dozor	

**Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce**  
(alebo jej dokončenej časti)

<b>Zástupcovia užívateľa:</b> Oddelenie správy komunikácií	Gabriela Koišová Ján Czafík Roman Svrček	Správca komunikácie Oddelenie správy komunikácií Oddelenie správy komunikácií	
<b>Ostatní účastníci konania:</b> METRO Bratislava a.s.	Gabriel Bálint	Autorský dozor	
<b>Rozdeľovník:</b> 1x Hlavné mesto SR BA, 1x EUROVIA SK a.s., 1x METRO Bratislava a.s., 1x správca OSK,			
<b>Vyjadrenie účastníkov:</b>			
